


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS**
(Studi Kasus pada Lima Proyek Konstruksi PT Gagas Energi Indonesia)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

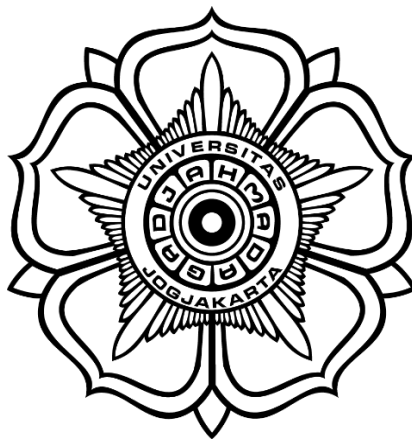

Diajukan Oleh :
Marshall Ohan Silitonga
NIM. 14/374721/PEK/19838

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2017**
